

检查报告

关注公众号


时间2022-11-01

文件名：tc264主板　　层数：4　　尺寸：98.62*64.87 mm

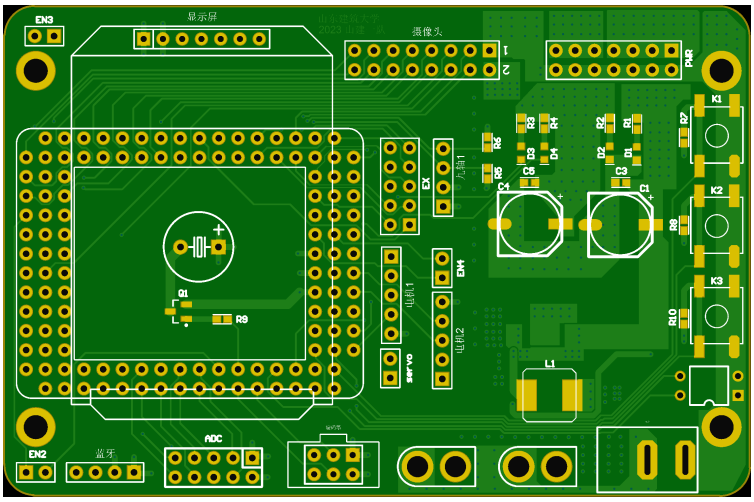

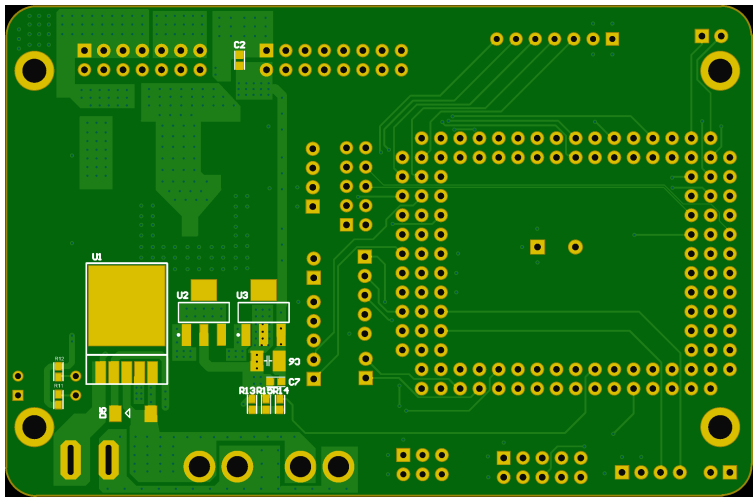

警示项

报告项目	类型	分析结果	描述与建议
焊盘规格	封装内间距异常	正常	
孔环	过孔孔环	有	 您的“过孔孔环”最小为infmil会影响产品可靠性，建议“过孔孔环”最小环 ≥ 5 mil

全部检查项

报告项目	类型	分析结果

电气信号	断头线	✅ 正常
	孤立铜	✅ 正常
	无效过孔	✅ 正常
	片式SMD没连线路	✅ 正常
	锐角	✅ 正常
最小线宽	最小线宽	✅ 正常 0.1524 mm
最小间距	线到线	✅ 正常 0.152092 mm
	盘到线	✅ 正常 0.152092 mm
	盘到盘	✅ 正常 0.152092 mm
最小焊盘	BGA焊盘	✅ 正常
	常规焊盘	✅ 正常
	长条焊盘	✅ 正常
SMD间距	同网络SMD焊盘间距	✅ 正常
	不同网络SMD焊盘间距	✅ 正常
	同器件焊盘间距	✅ 正常
	不同器件焊盘间距	✅ 正常
网格铺铜	网格线宽	✅ 正常
	网格线距	✅ 正常
孔大小	最小孔径	✅ 正常 0.3048 mm
	最大孔径	✅ 正常
	厚径比	✅ 正常
槽孔	最小槽宽	✅ 正常
	最大槽宽	✅ 正常
	槽长宽比	✅ 正常

孔环	过孔孔环	734pis 有
	插件孔孔环	正常
孔到孔	同网络过孔	正常
	不同网络过孔	正常
	插件孔	正常
孔到线	过孔到表层	正常 0.27934 mm
	插件孔到表层	正常
	过孔到内层	正常
	插件孔到内层	正常
	NPTH到铜	正常
板边距离	铜/PAD/线到板边距离	正常
	SMD到板边距离	正常
	孔到板边	正常
特殊孔	半孔	正常
	盲埋孔	正常
	盲埋孔距离	正常
	激光孔	正常
	正/长方形孔	正常
焊盘规格	焊盘大小异常	正常
	封装内间距异常	2pis 正常
孔上焊盘	盘中孔	正常
	插件孔	正常
	过孔上焊盘	正常
	非金属孔	正常

阻焊开窗	阻焊异常	✅ 正常
	阻焊盖线	✅ 正常
	阻焊间隙	✅ 正常
	同网络阻焊间隙	✅ 正常
	漏阻焊桥	✅ 正常
	同网络漏阻焊桥	✅ 正常
孔密度	孔密度	❗ 680个；10.63万/m²
沉金面积	沉金面积	❗ 36.54%
飞针点数	飞针点数	❗ 549
Mark点	Mark点	✅ 正常
锣长分析	锣长分析	❗ 50.9501m/㎡
